



Místo stavby: Nitra

Příloha č. A

Nabídka č. SK-001-RM-20

Sněhová oblast:	1	Šířka (m):	12.0	Výška základu H_2	0.00
Větrná oblast:	24	Délka (m):	20.0	Výška soklu H_3	0.20
Typ terénu:	II	Výška stěny H_1	5,0	Sklon střechy:	7°
metrů nad hladinou moře	200	C-C Rámy:	5.90m - 7.50m - 5.90m		

(Úroveň podlahy = 0.00 m)

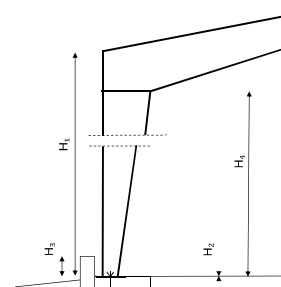
Extraordinary snow region 1**Rámy atd.**

Nosná konstrukce haly bez podpěrných sloupů,
vyrobených z vlnitých ocelových plechů, žebrových výztuh a pásnic.
2 ks. Hlavních ráků er ze svařované oceli.
2 ks štítových ráků z profilů válcovaných za tepla.
Ocel je otryskaná a natřena
barvou na polyureaové bázi v jednom ze standardních odstínů BORGA podle korozní třídy C3/M

Včetně ocelového zavětrování.

Šrouby pro spojení ráků.

Střešní vaznice a stěnové paždíky jsou vyrobeny z pozinkovaných C a Z profilů BORGA.

*Ocelová konstrukce nese ve shodě s evropskou normou EN 1090-1 označení CE.***Střecha:**

Panel (PIR) s tloušťkou 100/140 mm.

Lemování a oplechování dle standardů BORGA

Spojovací prvky dle standardů BORGA.

bez přesahů.

Stěny:

PIR-Panely s tloušťkou 80 mm umístěny vertikálně.

Lemování a oplechování dle standardů BORGA

Spojovací prvky dle standardů BORGA.

Přiznaný spoj

Ostatní příslušenství

Všechny rozměry š x v

Okapový systém BORGA.

1 ks Dveře PVC, izolované, levé, otevíravé ven, stavební otvor ~1100x2070 (Dveře ~0.9 x 2.0m).

1 ks Sekční vrata, izolovaná, stav. otvor 4000x4000 mm, elektr. ovl.

6 ks Oken, 3-dílná, dvojsklo, s bílým PVC rámem, fixní, stavební otvor ~3000 x 1100 mm.

Nabídka neobsahuje řešení požární odolnosti.

Nabídka neobsahuje projekt a dodávku uzemnění s bleskosvodem.

Zatížení sněhem, větrem a kategorie terénu se může změnit v závislosti na přesném umístění.

Cena: 39 700 € +DPH

Montáž 10 200 € +DPH

Nabídka zahrnuje montáž dodaných materiálů BORGA za (kromě instalace kotevních prvků do základů)

Základy

Investor je odpovědný za přípravu základů dle požadavků BORGA.

Nabídka neobsahuje závitové tyče pro spojení základové patky a konstrukce

Podmínky dodání a prodeje

Dle smlouvy o dílo (doprava na místo stavby)

Připravenost staveniště:

Další informace

Realizace proběhne dle schválených realizačních výkresů ze dne případně dle standardů BORGA

Součástí dokumentace jsou: půdorys, pohledy a montážní výkresy.

Záruka na materiál je 2 roky.

Termíny a cena uvedená v nabídce jsou platné 2 týdny od data vystavení.

Doufáme, že nabídka je dle Vašich představ,

Robert Mandalík
