

Místo stavby: Trnava

Příloha č. 2

Nabídka č. SK-001-RM-22

Sněhová oblast:	1	Šířka (m):	24.0	Výška základu H_2	0.00
Větrná oblast:	24	Délka (m):	60.1	Výška soklu H_3	0.20
Typ terénu:	II	Výška stěny H_1	5.0	Sklon střechy:	7°
metrů nad hladinou moře	200	C-C Rámy:	5.30m - 7x7.00m - 5.30m		

(Úroveň podlahy = 0.00 m)

Extraordinary snow region 1**Rámy atd.**

Nosná konstrukce haly bez podpěrných sloupů,
vyrobených z vlnitých ocelových plechů, žebrových výztuh a pásnic.
8 ks. Hlavních ráků ze svařované oceli.
2 ks štítových ráků z profilů válcovaných za tepla.
Ocel je otryskaná a natřena
barvou na polyuretanové bázi v jednom ze standardních odstínů BORGA podle korozní třídy C3/M

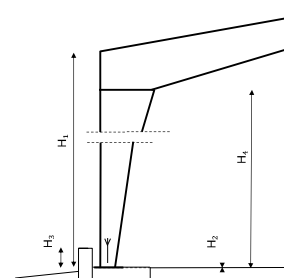
Včetně ocelového zavětrování.
Šrouby pro spojení ráků.
Střešní vaznice a stěnové paždíky jsou vyrobeny z pozinkovaných C a Z profilů BORGA.

*Sloupy jsou ukotveny k základové patce na úrovni: +/- 0.0 m**Ocelová konstrukce nese ve shodě s evropskou normou EN 1090-1 označení CE.***Střecha:**

Střecha je zakryta Borgia Super-40, tloušťky 0.6 mm, nátěr P 30 v odstínech dle standardů BORGA.
Lemování a oplechování dle standardů BORGA
Spojovací prvky dle standardů BORGA.
bez přesahů.

Stěny:

Venkovní stěna je opláštěna trapézovým plechem Borgia BPE-18, tloušťky 0.5 mm, nátěr P 30 v odstínech dle standardů BORGA
Lemování a oplechování dle standardů BORGA
Spojovací prvky dle standardů BORGA.

Opláštění haly začíná na úrovni: + 0.2 m

Všechny rozměry š x v

Větraný hřebenač.

1 ks Posuvná vrata 1-křídla neizolovaná, stavební otvor ~4000x4000 opláštění BPE-18 - 0.5 mm

Stěnový prosvětlovací pás na bočních stěnách (~58+58 m x ~1.2 m), neizolovaný (~137m²)

Nabídka neobsahuje řešení požární odolnosti !

Nabídka neobsahuje projekt a dodávku uzemnění s bleskosvodem !

Na ostatní příslušenství se nevztahuje BORGa záruka a řídí se záručními podmínkami konkrétních subdovatelů !

CENA ZA DODÁVKU OCELOVÉ HALY: 159 300.- € CENA ZA VÝSTAVBU OCELOVÉ HALY: 19 300.- €

Nabídka zahrnuje montáž dodaných materiálov BORGA, kromě instalace kotevních prvků do základů. (Montáž v letním období.)
rámů, Z a C profilů, trapézových plechů, okapového systému, vrat, dveří, prosvětlovacích pásů

Investor je odpovědný za přípravu základů dle požadavků BORGA.

Nabídka neobsahuje závitové tyče pro spojení základové patky a konstrukce

Podmínky dodání a prodeje

Dle smlouvy o dílo (doprava na místo stavby)

Dle přílohy č.3 SoD 2.

Realizace proběhne dle schválených realizačních výkresů ze dne případně dle standardů BORGA

Součástí dokumentace jsou: půdorys, pohledy a montážní výkresy.

Záruka na materiál je 2 roky (vyjma ostatního príslušenství), na povrchovou úpravu plechů BORGA 10 let dle záručního listu.

Podmínky nabídky: Nabídka je pouze orientační.

Robert Mandalík
